

令和4年1月28日

大型公共施設建設調査特別委員会

環境部 廃棄物処理課  
(新清掃工場建設担当)

浜松市新清掃工場及び新破碎処理センター施設整備運営事業  
事業進捗状況について

- |                    |      |
|--------------------|------|
| 1 造成・アプローチ道路工事について | 資料-1 |
| 2 建築・プラント工事について    | 資料-2 |


工事工程表 (造成・アプローチ道路工事)

		令和3年度												現在		令和4年度												令和5年度												令和6年度																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月																
造成工事	敷地造成	[Orange bar]												[Blue dashed line]																																										
	調整池堰堤工	[Pink bar]																																																						
	管理用道路	[Blue bar]												[Blue dashed line]																																										
アプローチ道路工事	道路整備	[Green bar]												[Blue dashed line]		[Green bar]																																								
	橋梁(1号)	[Red bar]														[Blue dashed line]																																								
	橋梁(2号)	[Red bar]												[Blue dashed line]		[Red bar]																																								

施設稼働開始

工事箇所概略図

造成・アプローチ道路工事  
R3.12月末進捗率  
84.7%

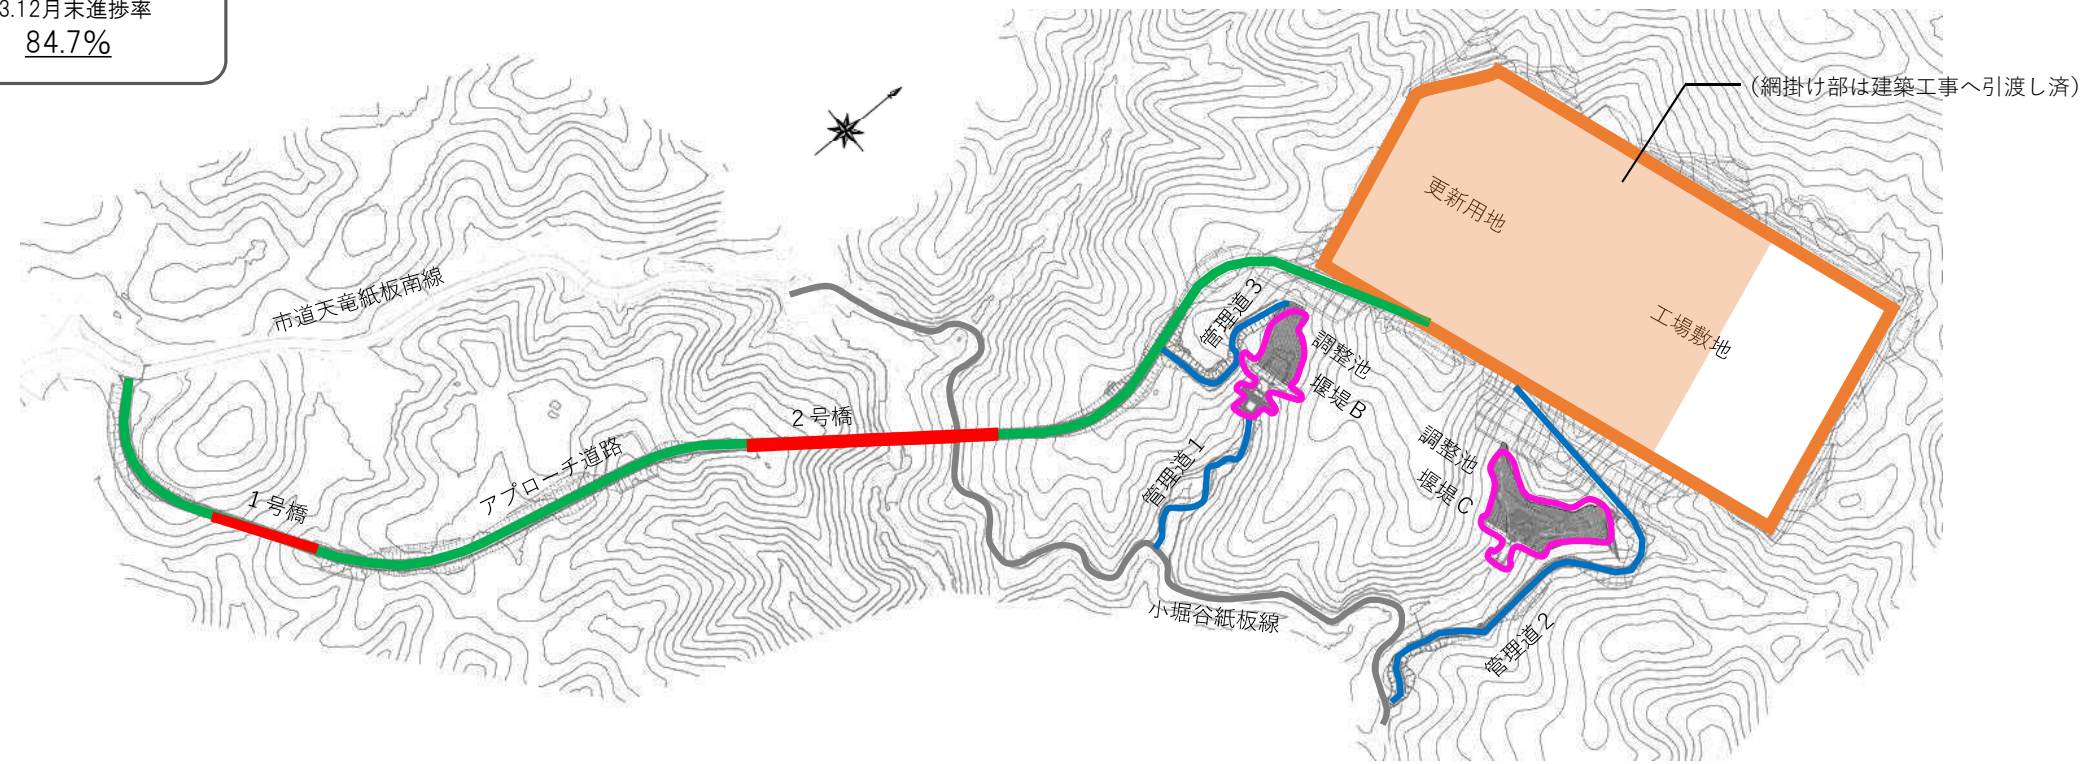

工事工程表（建築・プラント工事）

環境部 廃棄物処理課  
（新清掃工場建設担当）

	令和3年度												現在		令和4年度												令和5年度												令和6年度			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月			
建築工事	工場棟	[Red bar]												[Red bar]		[Red bar]												[Red bar]												[Red bar]		
	付属棟 (管理棟・洗車棟 他)	[White]												[White]		[White]												[Orange bar]												[White]		
	外構	[White]												[White]		[White]												[Green bar]												[White]		
プラント工事	機器設計・製作	[Grey bar]												[Grey bar]		[Grey bar]												[Grey bar]												[White]		
	機器据付	[White]												[White]		[Red hatched bar]												[White]												[White]		
	試運転	[White]												[White]		[White]												[White]												[Grey bar]		

建築工事  
R3.12月末進捗率  
14.2%  
(プラント工事 除く)

施設稼働開始

工事箇所概略図

